

2024-11-08

Kommande aktiviteter Stanstorpsskolan Vecka 46,47 och 48



Vecka 46

Markarbeten yttre VA, schakt inre ledning samt grund Etapp 6

El-kanalisation under platta på mark etapp 6

Inre avlopp etapp 6

Grundläggning Etapp 4/5

Gjutning av platta etapp 2

Vecka 47

Markarbeten yttre VA etapp 8, spilledning mot befintlig skolan

schakt inre ledning samt grund Etapp 6

El-kanalisation under platta på mark etapp 6

Grundläggning Etapp 5/6

Cellplast/armeringsmattor etapp 4

Vecka 48

Markarbeten yttre VA, schakt inre ledning samt grund Etapp 8

El-kanalisation under platta på mark etapp 6


Inre avlopp etapp 8

Grundläggning Etapp 6


Cellplast/armeringsmattor etapp 5

Etablering stommontörer



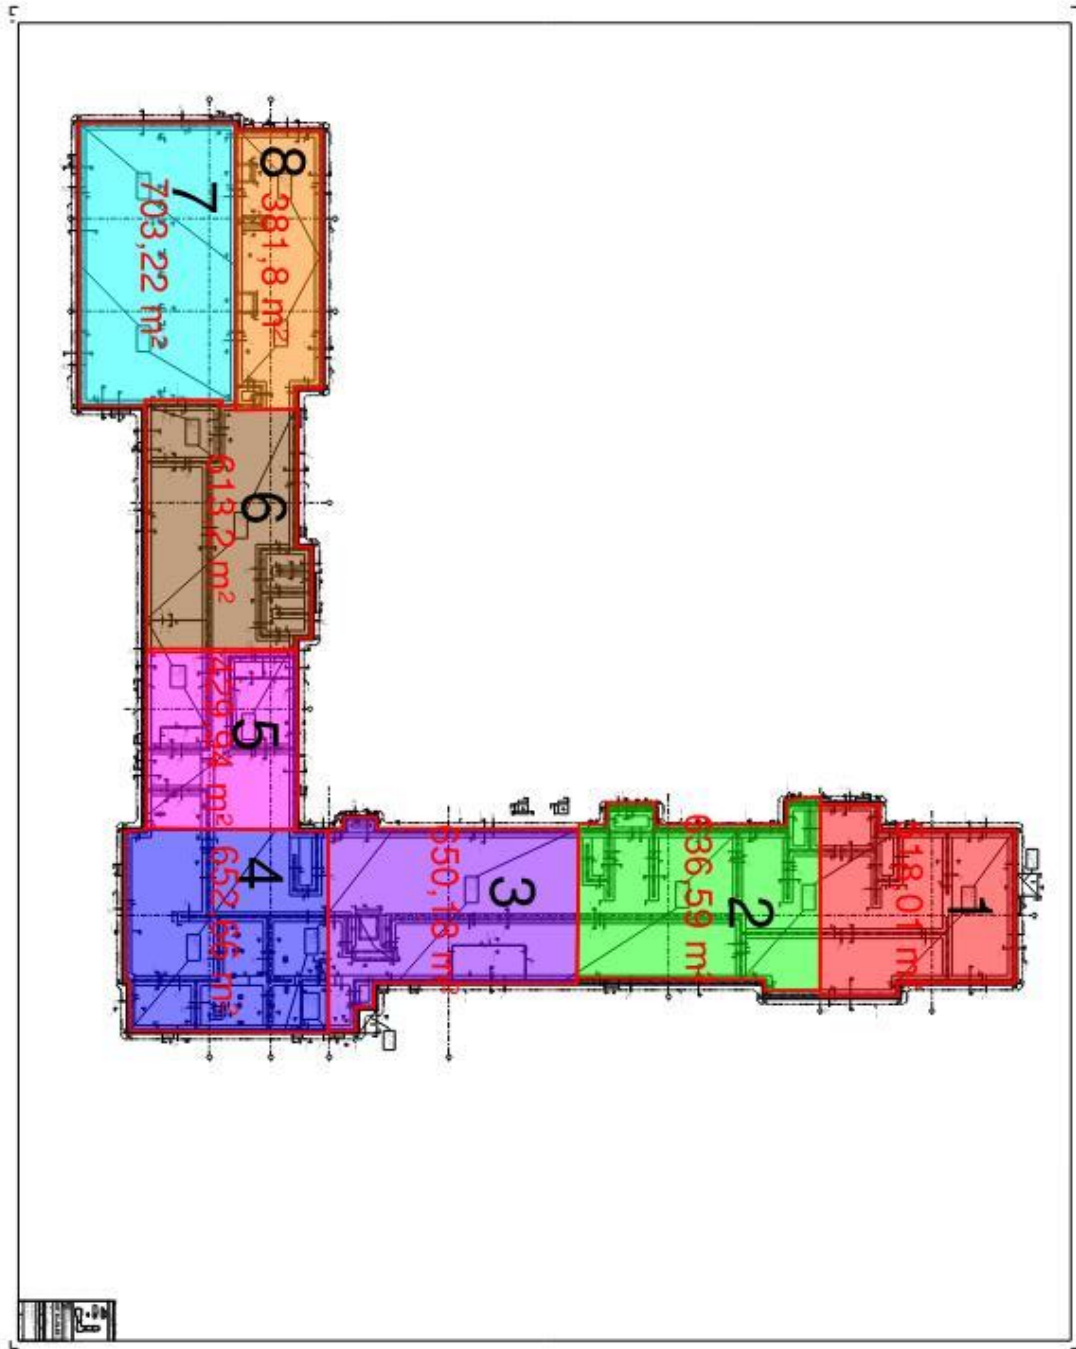

2024-11-08

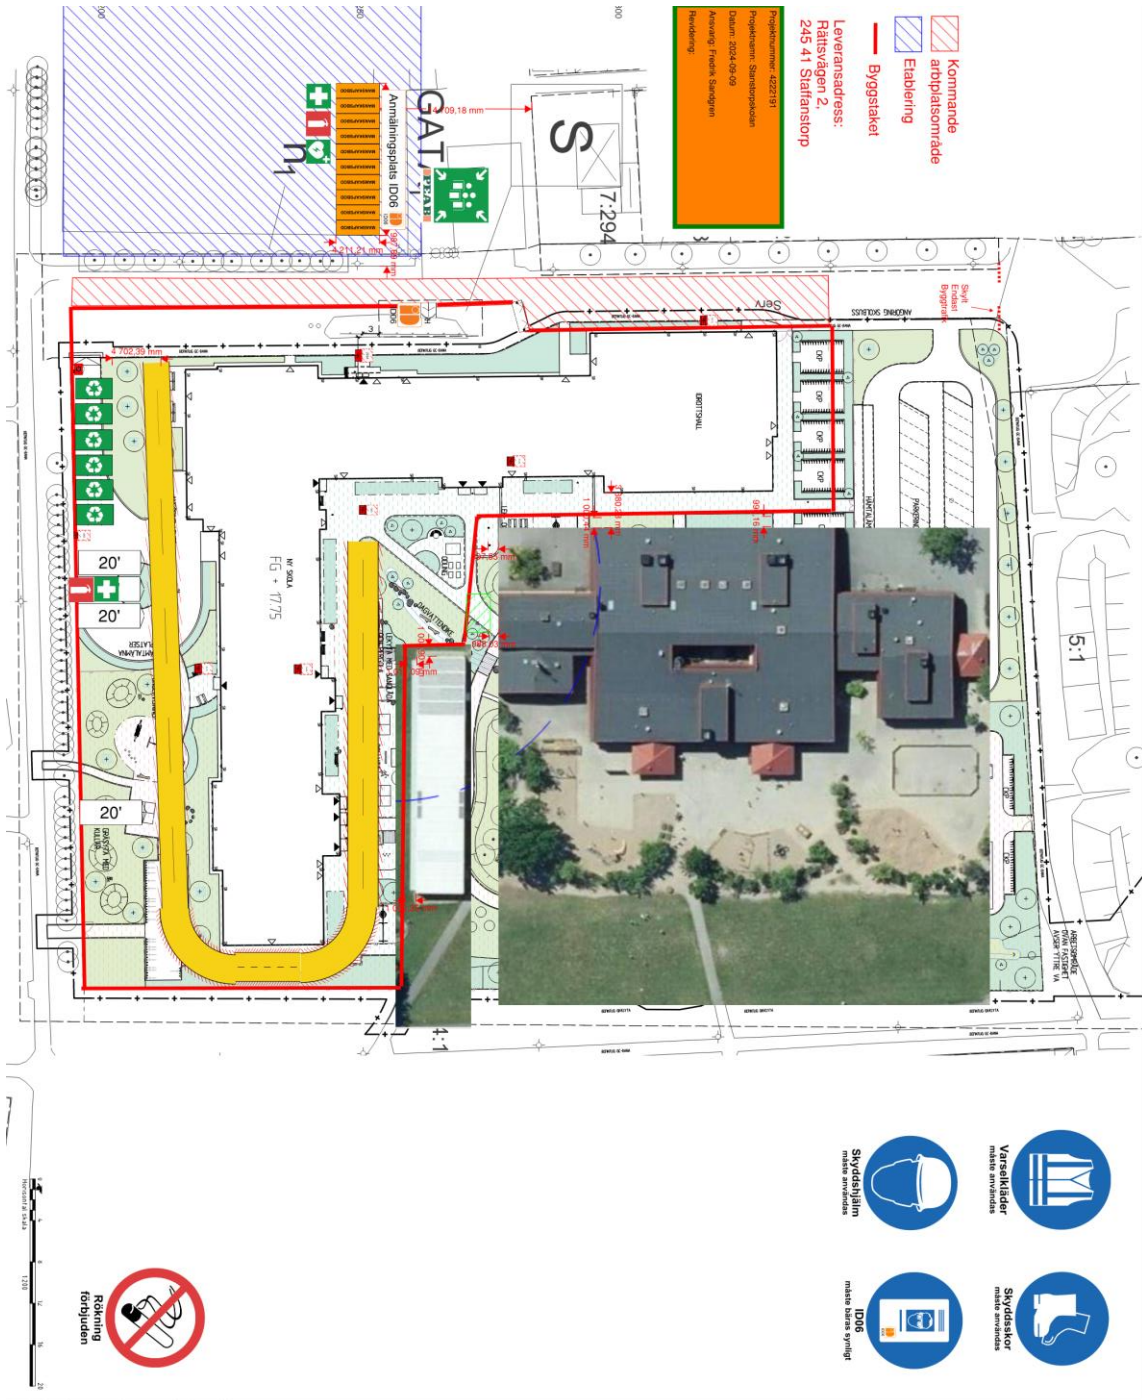

Vid eventuella problem kontakta gärna personalen på plats eller så kan ni höra av er till:
Carl-Filip Hedlund 0725-33 00 64.
